Info-Travaux : Parc des Neiges Sud

Date: 17 mai au 23 mai 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : P. Sud, P. Nord et Branche C, D, E, F, G, I, et K
- Forage, dynamitage : P. Nord, Branche C, D et E
- Fondations : Branche J, K et L
- Réseau collecteur : P. Nord, P. Sud

Règles de sécurité:

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

borea

BORALEX

PARCS ÉOLIENS
de la Seigneurie de Beaupré
Des Neiges – Secteur sud

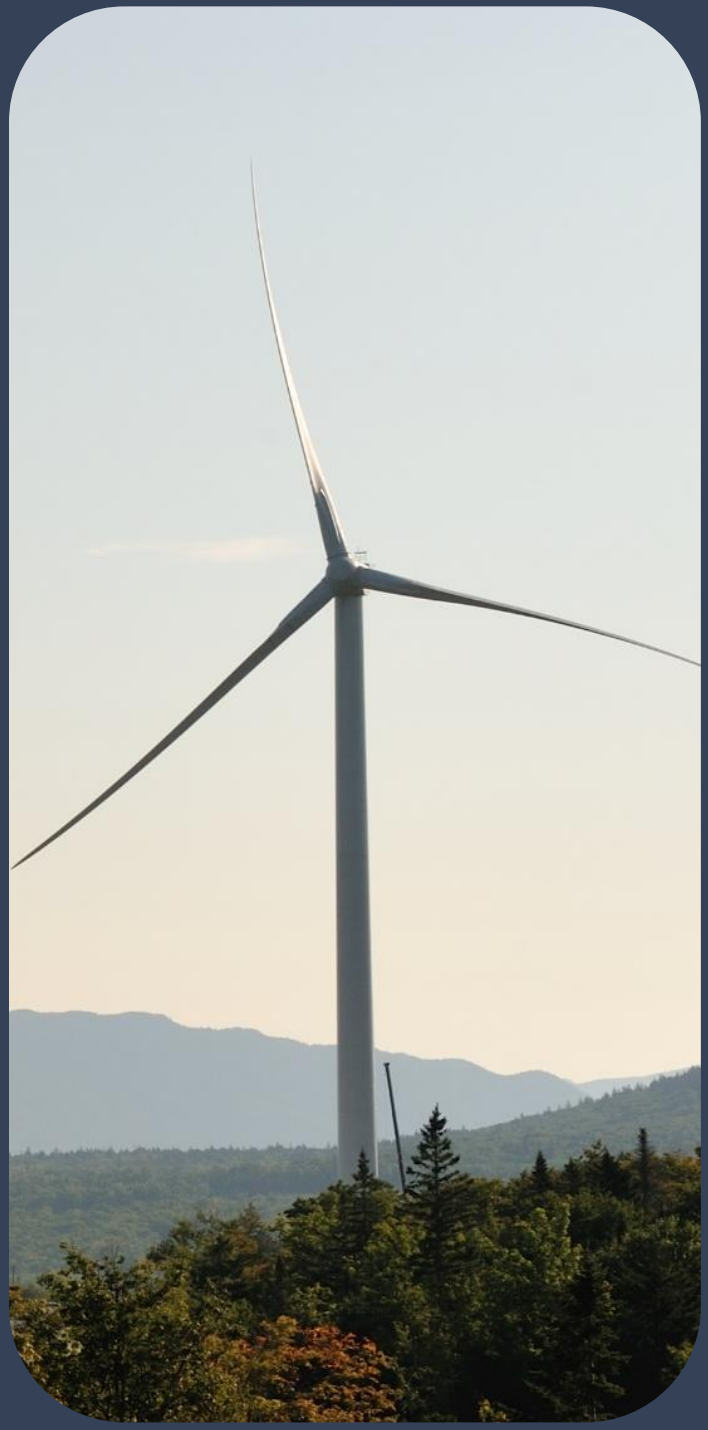

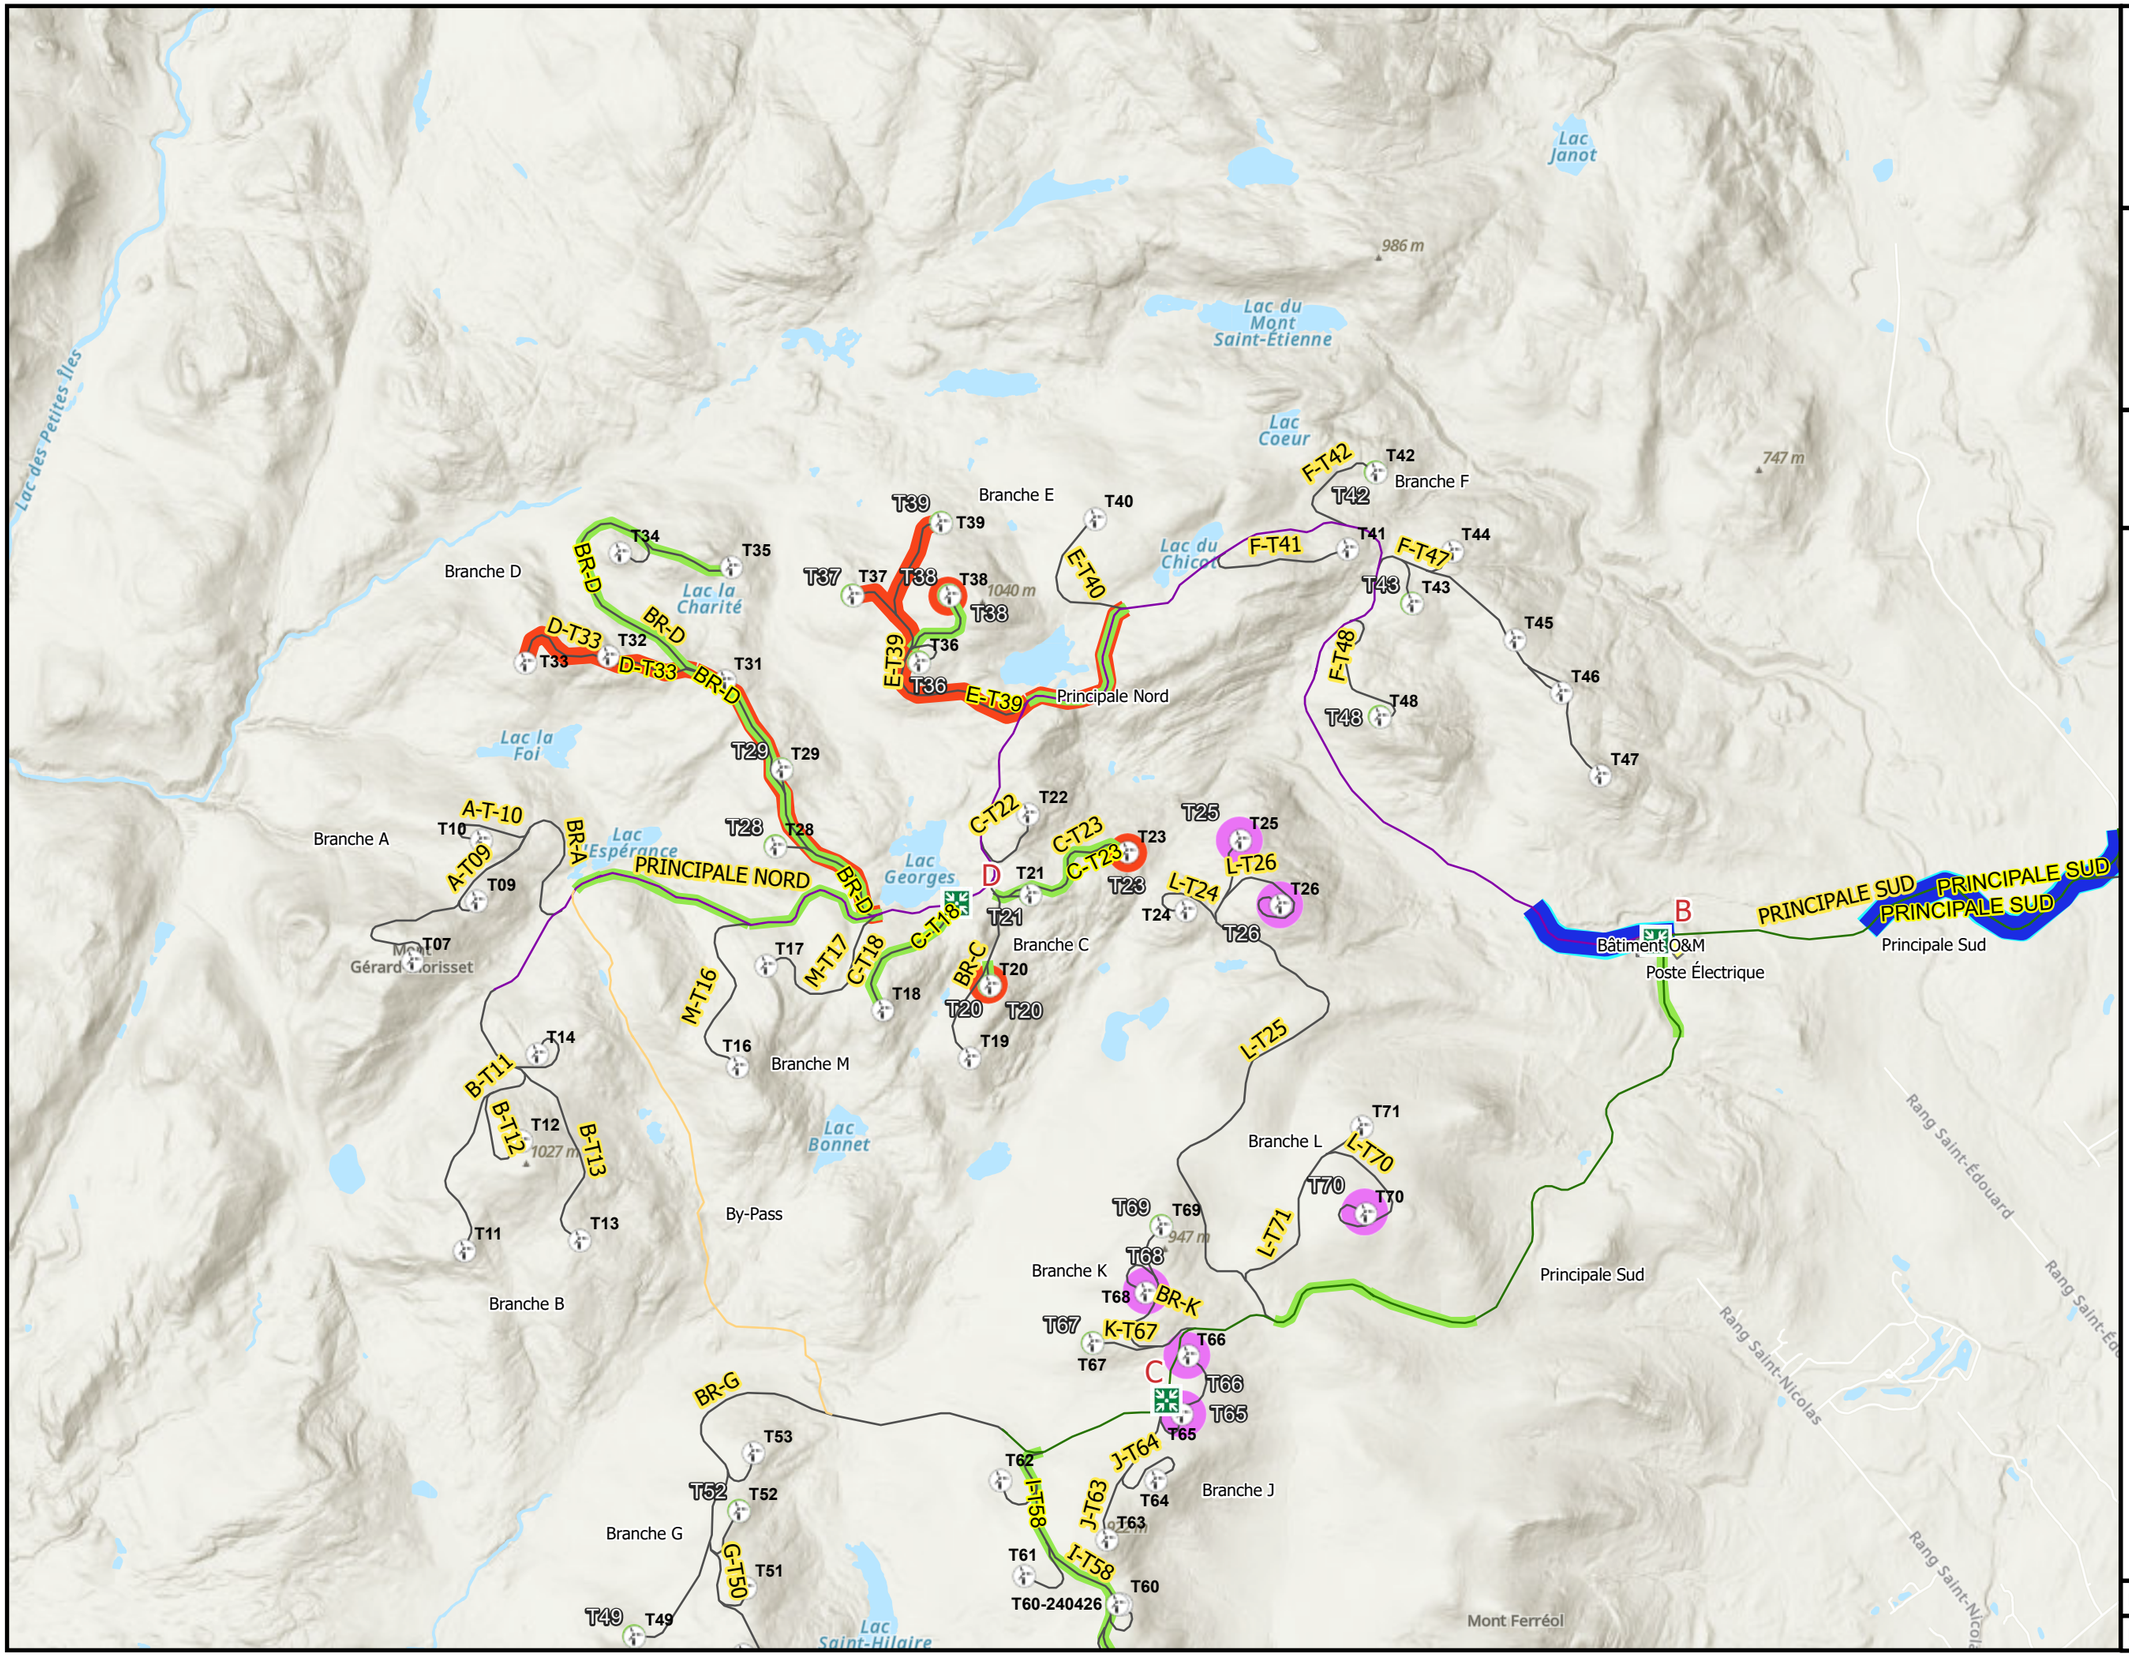

borea

BORALEX

PROJET DES NEIGES SUD

LÉGENDE

- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres
- Zones Rouges

Date : 5/15/2026	Préparé par : SB
Ref. : DNS_Info-Travaux	Rev. : 00
