Info-Travaux : Parc des Neiges Sud

Date: 22 mars au 28 mars 2026

Travaux en semaine :

- Décapage : P.Nord
- Terrassement, forage, dynamitage : P.Nord
- Ponceaux : P. Nord, Branche L, Branche I
- Base-mid : T62, T69

Règles de sécurité:

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

borea

BORALEX

PARCS ÉOLIENS
de la Seigneurie de Beaupré
Des Neiges – Secteur sud

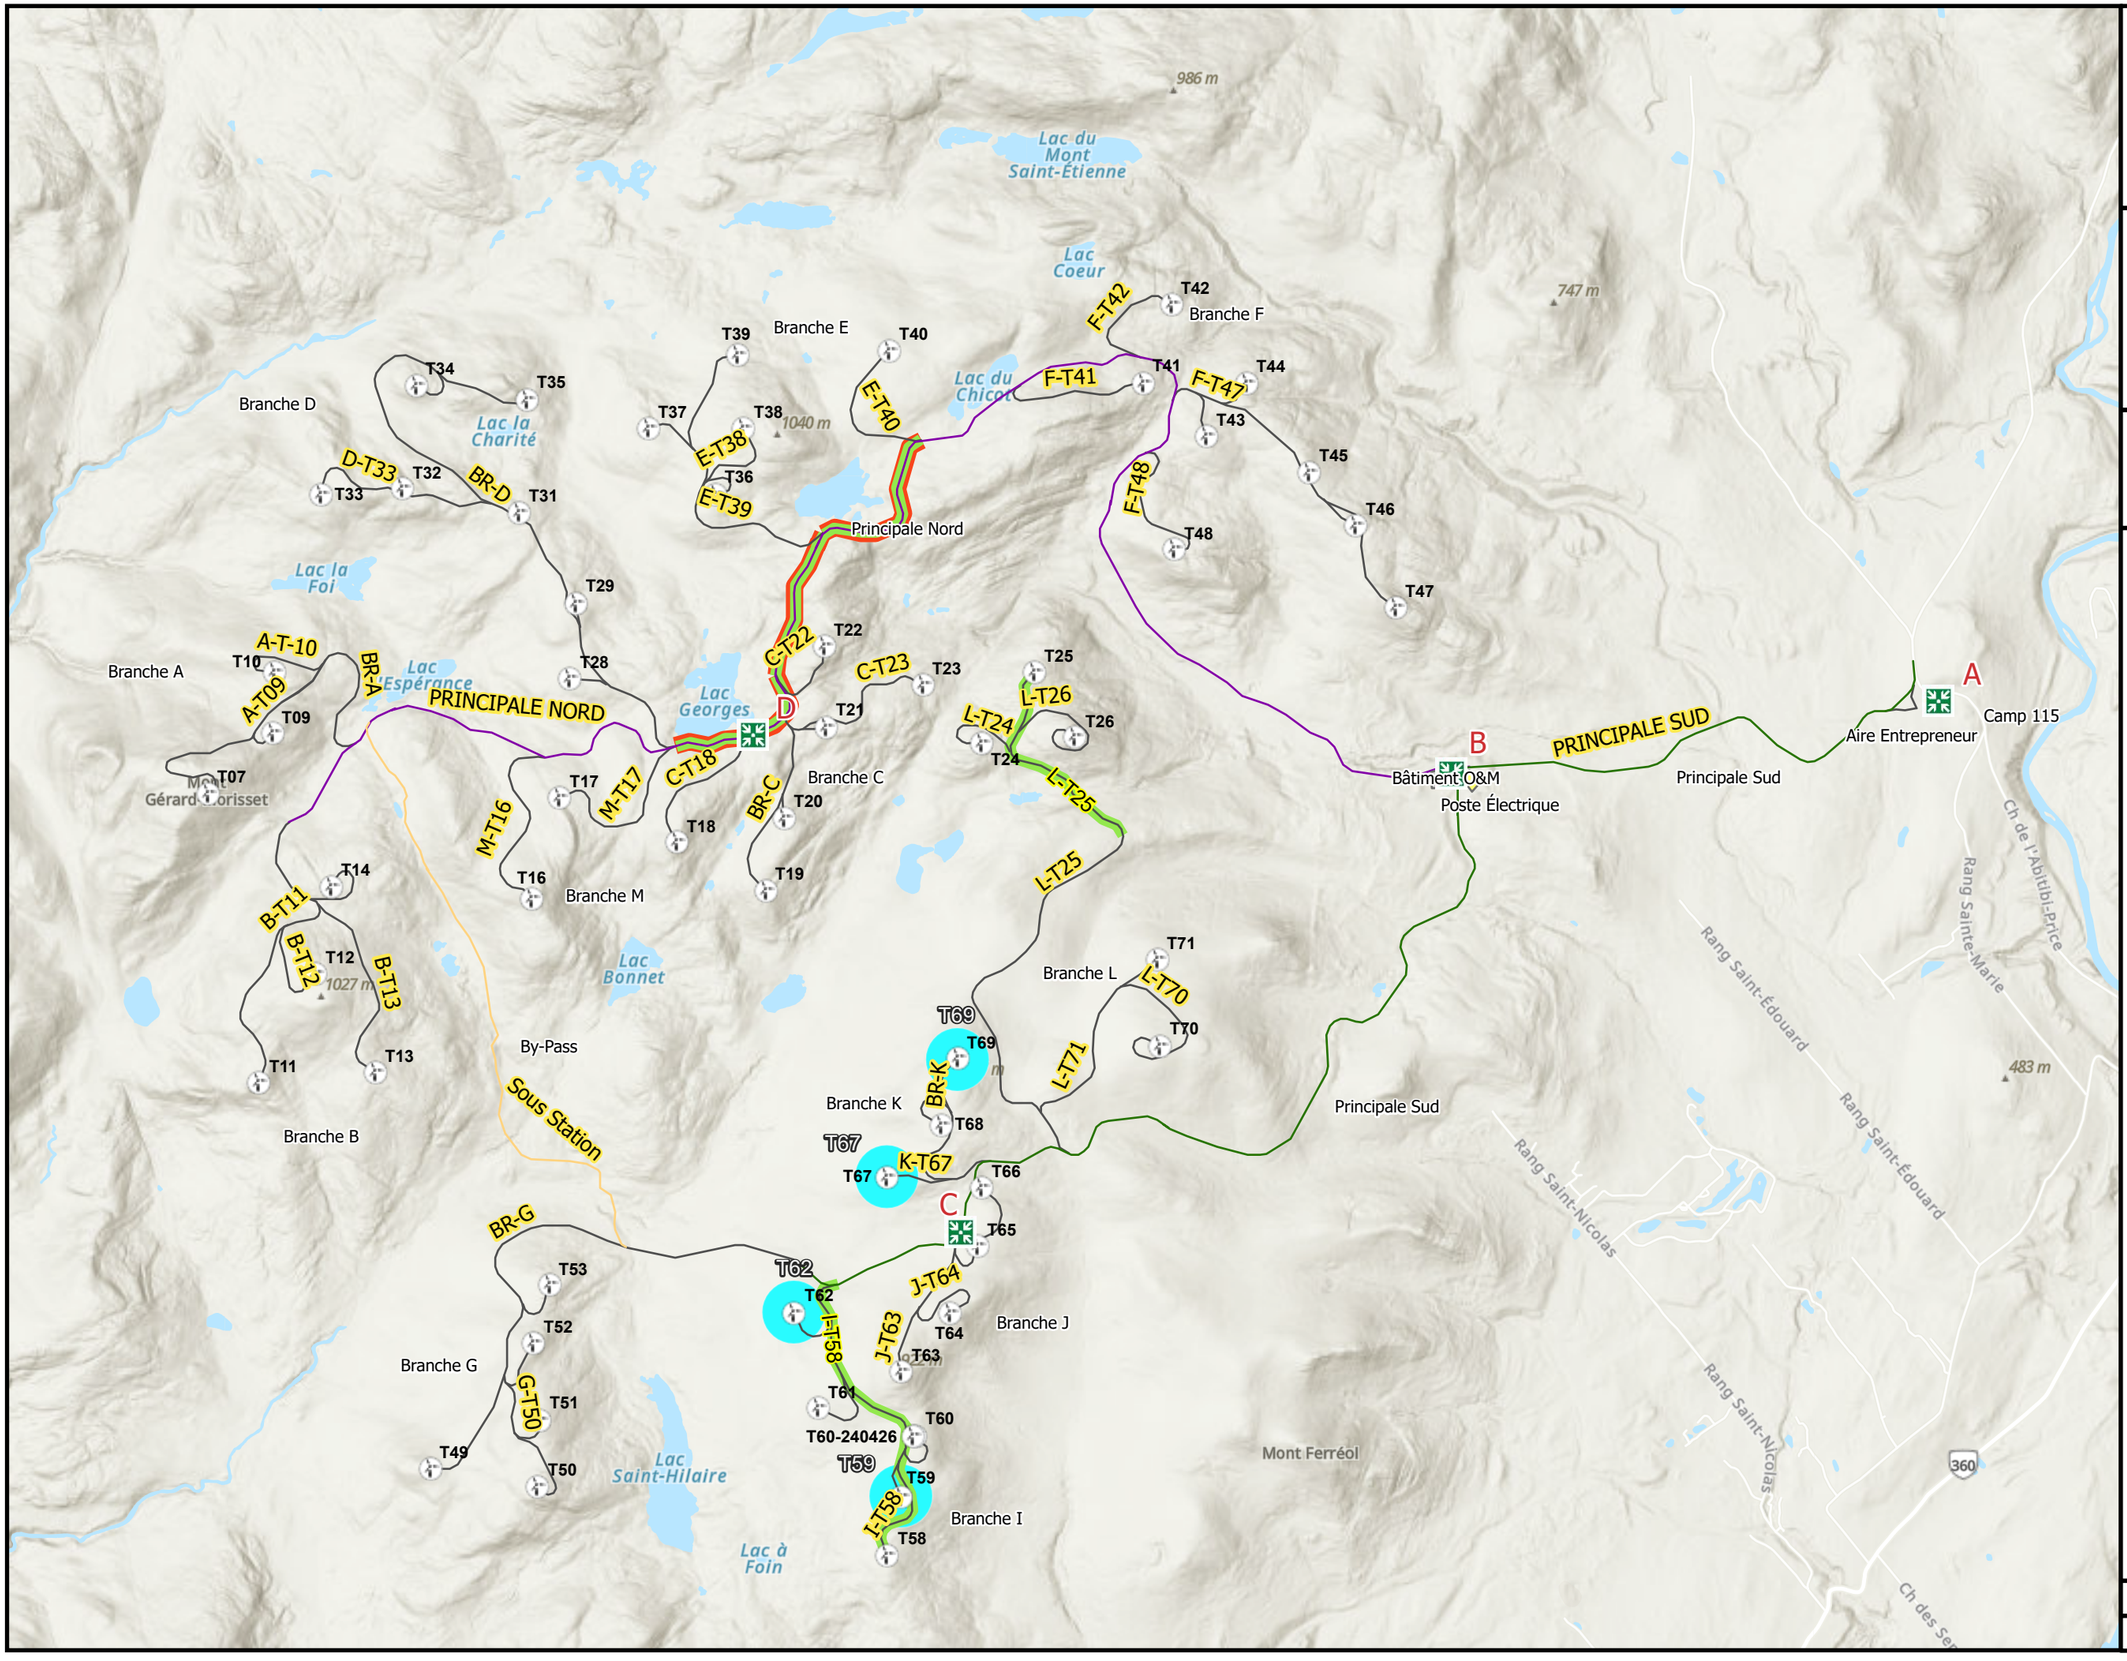

borea

BORALEX

PROJET DES NEIGES SUD

LÉGENDE

- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres
- Zones Rouges

Date : 3/20/2026	Préparé par : SB
Ref. : DNS_Info-Travaux	Rev. : 00
